RIEPILOGO:Prev. 01/10/2018 - 30/09/2019 = 365 gg. Giorni lavorativi Prev.254 gg

LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI
1.- CANTIERIZZAZIONE	01/10/2018	30/04/2019	63
2.- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	31/10/2018	09/05/2019	19
3.- RIPRISTINI STRUTTURALI	10/11/2018	24/05/2019	29
4.- RIVESTIMENTO A CAPPOTTO E FINITURE.	24/11/2018	05/08/2019	148
5.- OPERE DA LATTONIERE	07/02/2019	08/08/2019	5
6.- SOSTITUZIONE INFISSI	07/02/2019	19/09/2019	92
7.- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	15/11/2018	22/05/2019	14
8.- IMPIANTI IDRICO-SANITARI	10/11/2018	15/05/2019	11
9.- SMOBILIZZO DEL CANTIERE	26/03/2019	30/09/2019	14
MESE			

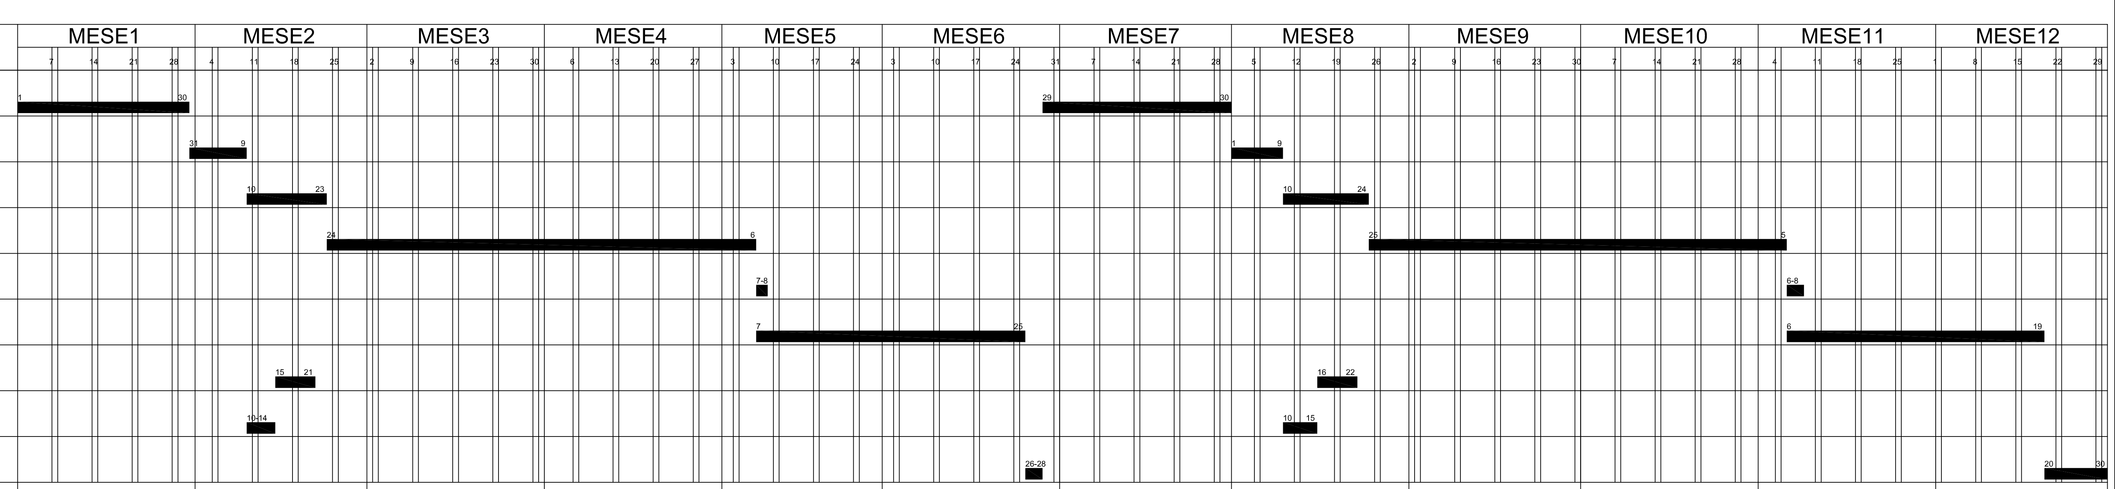

ARCA NORD SALENTO

GIA' I.A.C.P. PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

INTERVENTO DI ERP
AI FINI DEL RECUPERO E RISANAMENTO
ALLOGGI E.R.P.
NEL COMUNE DI BRINDISI
QUARTIERE S. ELIA
VIA E. GOLA, VIA D. RANZONI - LOTTO 51.

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA :
ING. Amilcare LICASTRO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
ARCH. Gianluca TUCCI

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
ING. Amilcare LICASTRO

DATA : maggio 2018

SCALA :

ARCHIVIO :

CRONOPROGRAMMA
